

/ documentacion ejecutiva

Flujogramas por lote

Ctrl.S - Reforma de lotes + matriz de modelado. Los 8 lotes actualizados al proceso vigente. La etiqueta triangulo azul marca lo actualizado respecto de los Miro.


1. [Proceso general \(L1 - L8\)](#)
2. [L1 - Modelo base](#)
3. [L2 - Detallado ARQ + parametros](#)
4. [L3 - Ingenierias 2D](#)
5. [L4 - Ingenierias 3D](#)
6. [L5 - Coordinacion + completitud](#)
7. [L6 - Documentacion](#)
8. [L7 - Locales](#)
9. [L8 - Detalles](#)


Version a validar - no definitiva.

El proceso, de punta a punta — L1 → L8

Vista general de los 8 lotes. Lo clave: **L1 a L4 corren una vez por proyecto**; de **L5 en adelante el ciclo se repite por cada nivel**. El plano de interferencias es la bisagra que separa coordinar de completar.

Actualizado al proceso vigente · a validar

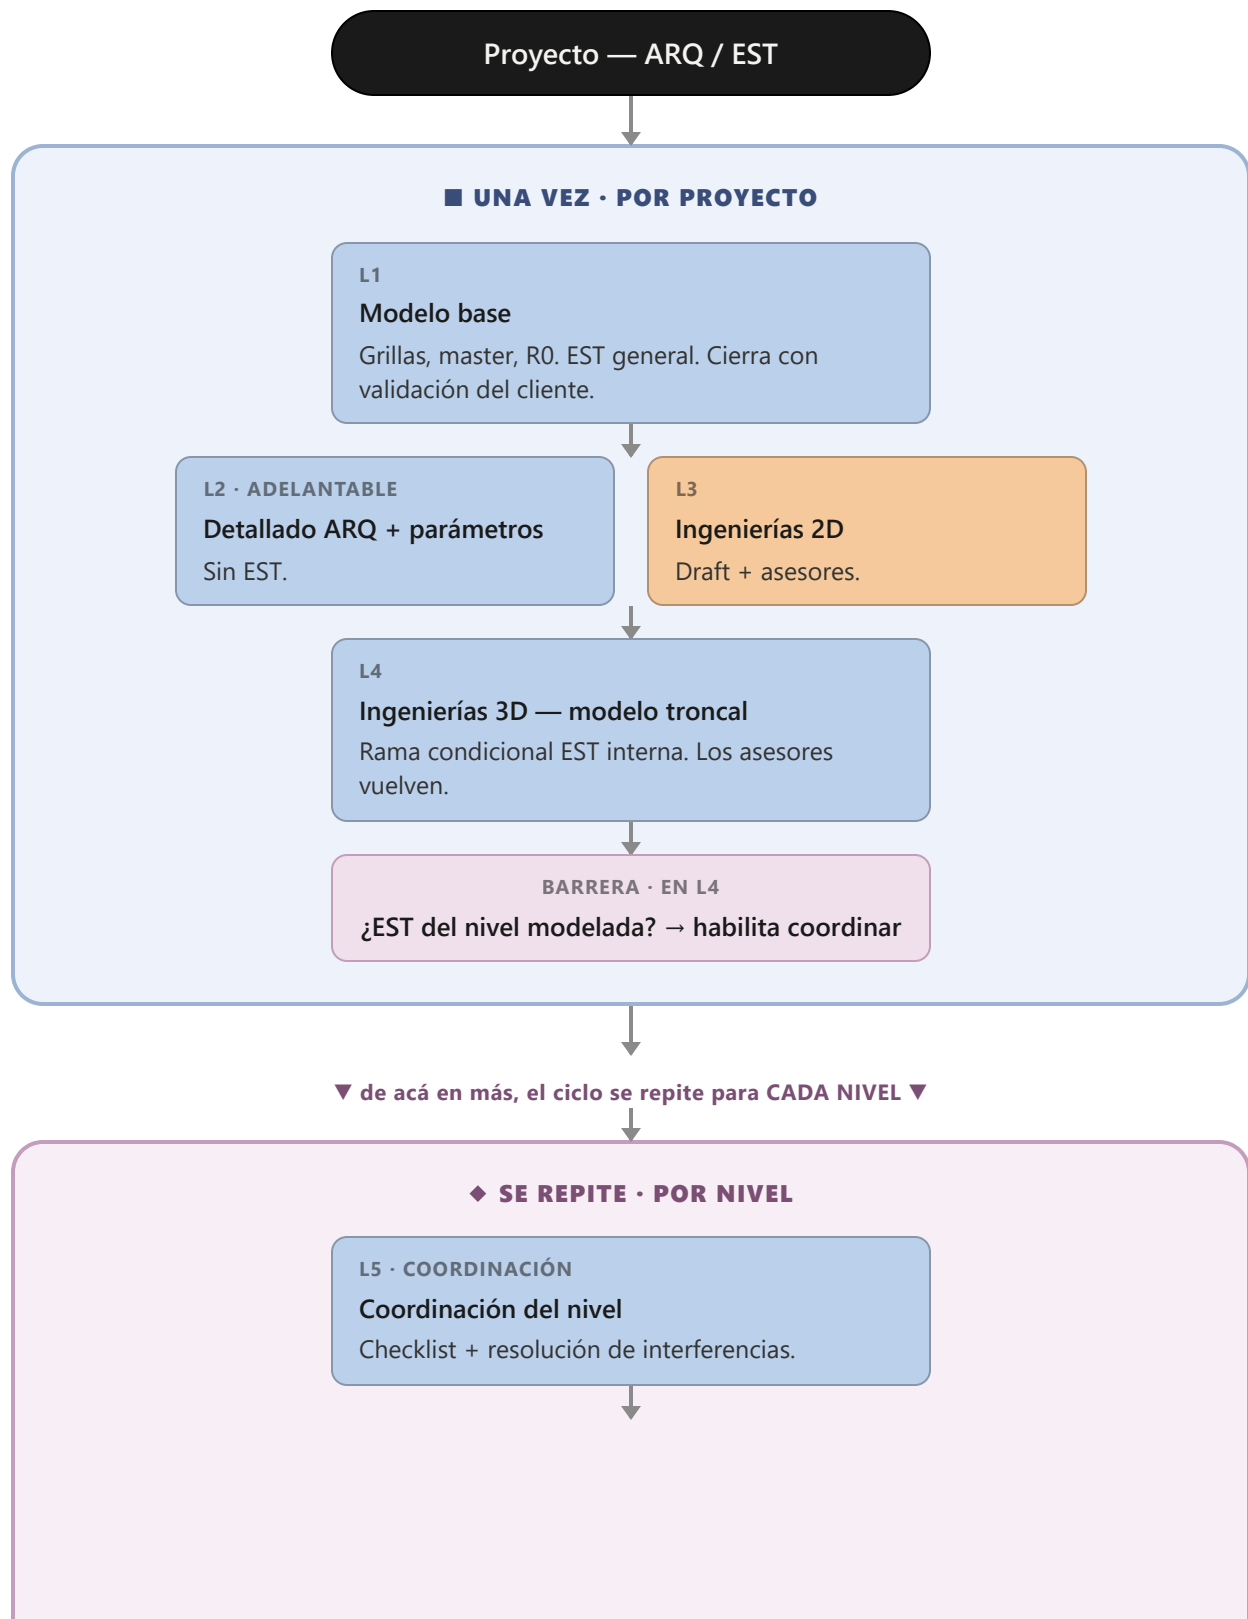

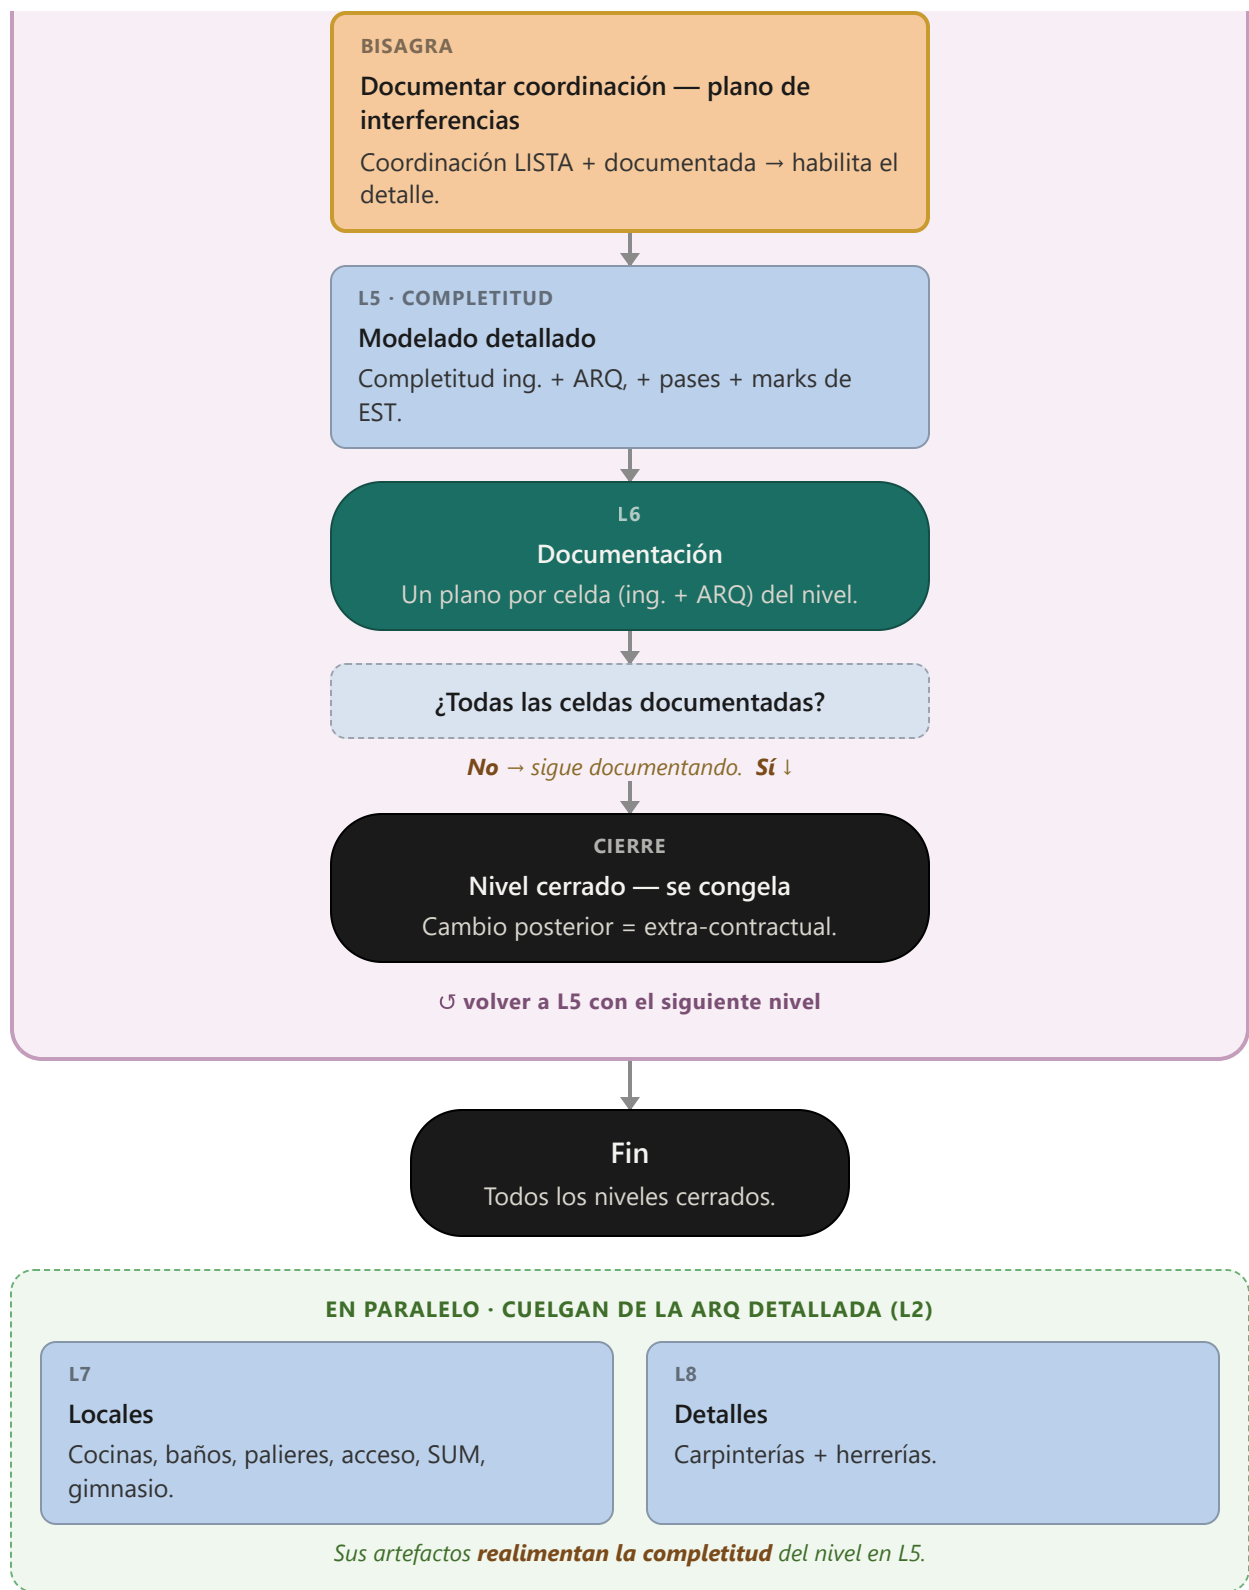

REFERENCIAS


Por proyecto (una vez) Por nivel (se repite) Proceso Draft / bisagra Documentación Cierre


Modelo base

Grillas, master y R0 del proyecto, incluida la **estructura general**. Cierra con la **validación del cliente**: sin cliente que aprueba, el proyecto no está estable.

Actualizado al proceso vigente · a validar

Actores: Ctrl.S Cliente Asesor

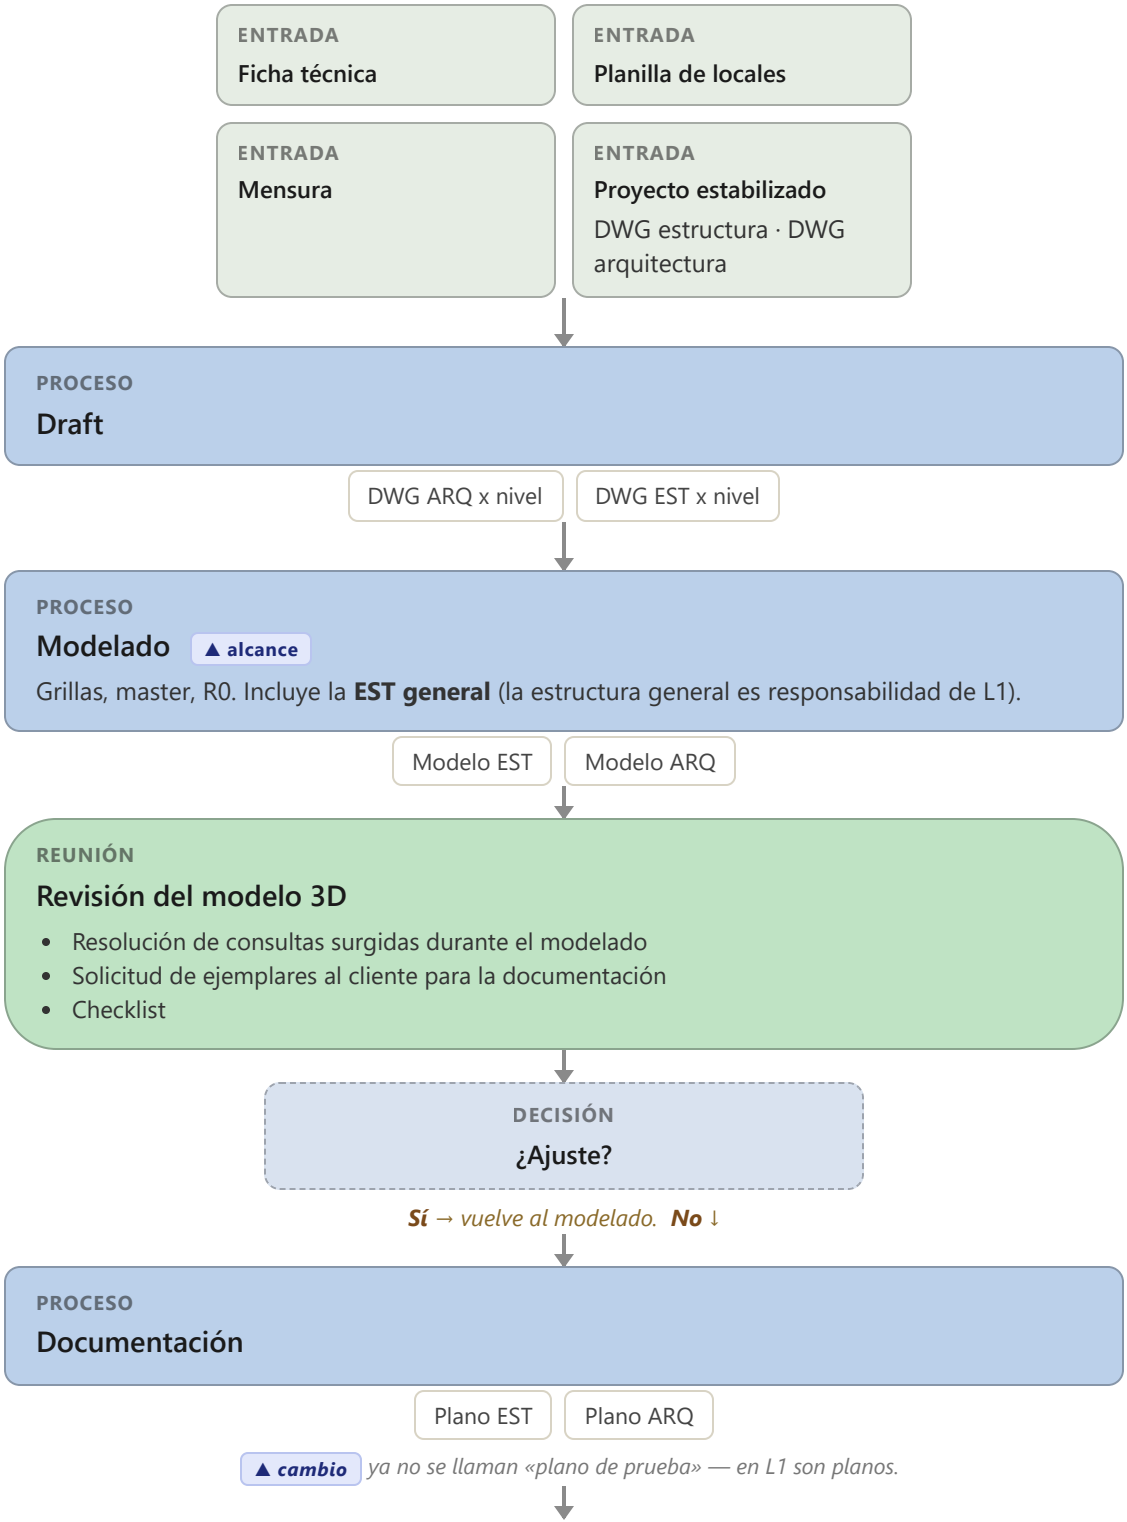

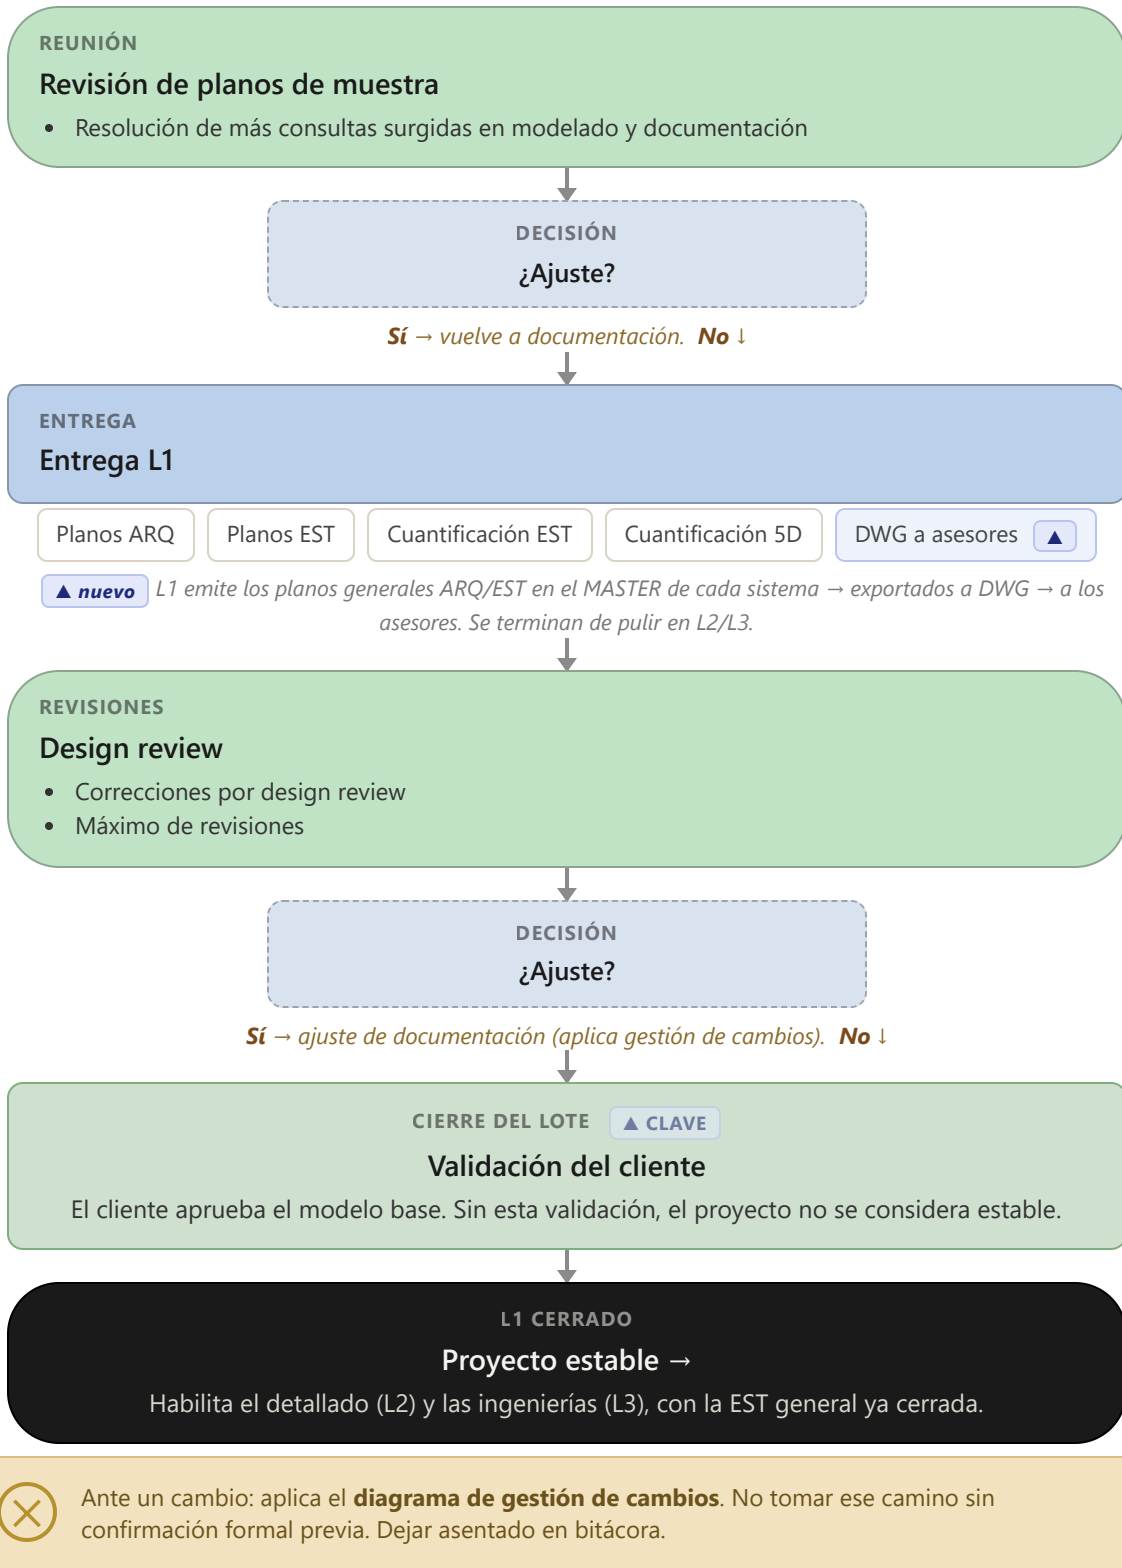


REFERENCIAS

- Entrada Proceso Reunión Decisión Validación cliente Cierre Gestión de cambios
- ▲ actualizado vs. Miro

Detallado ARQ + parámetros

Detalle de la arquitectura y carga de parámetros/planillas. Corre **en paralelo**: no frena la coordinación, pero es condición para documentar la arquitectura. *Ya no incluye estructura.*

Armado del resumen (no había Miro) · a validar

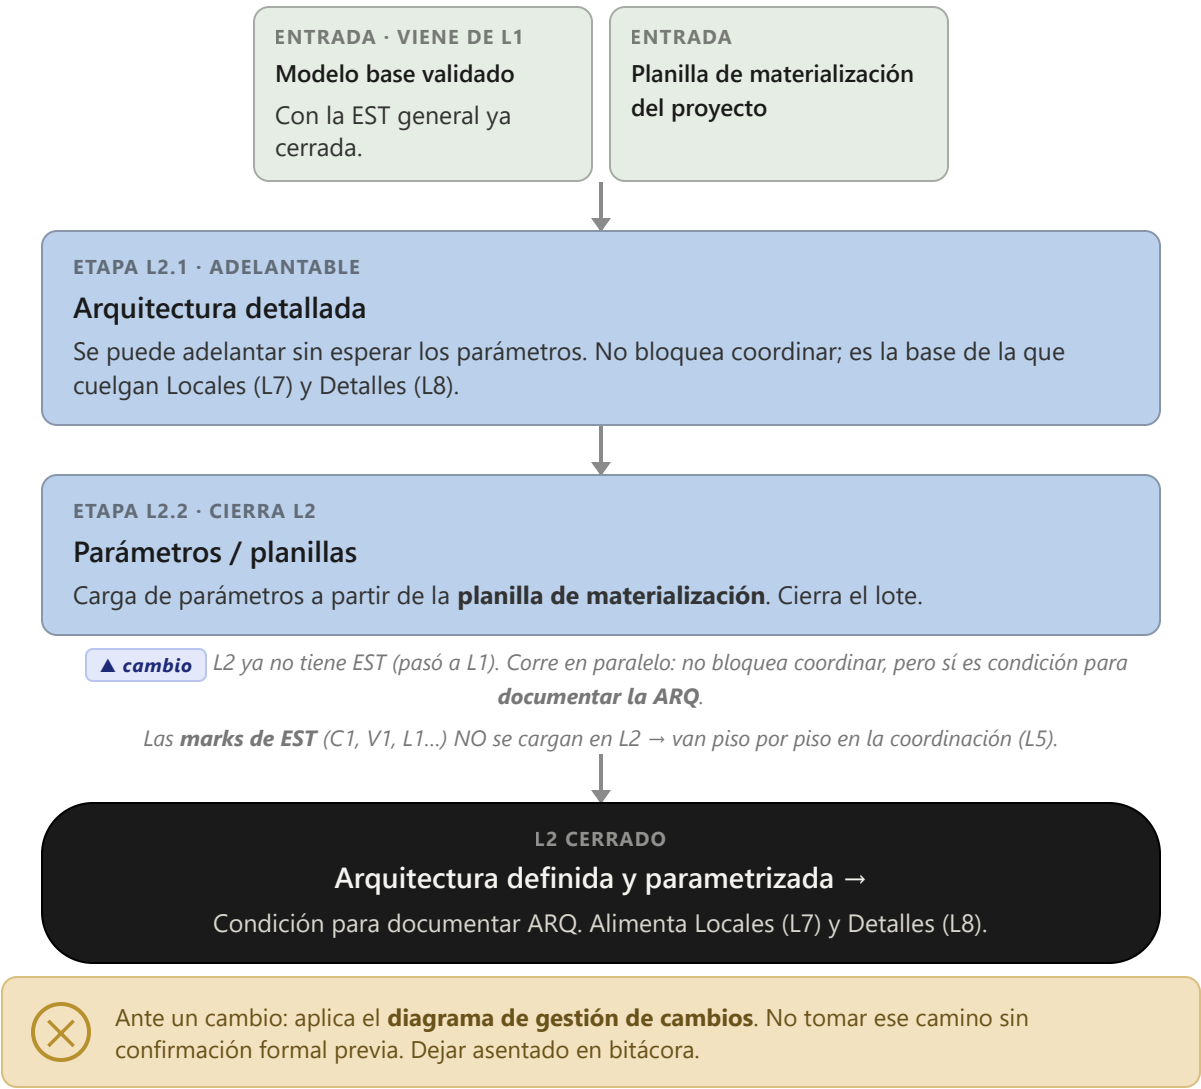


REFERENCIAS

Entrada Proceso Cierre Gestión de cambios ▲ actualizado

Ingenierías 2D

Definición técnica de **estructura e instalaciones** en 2D con los asesores, coordinación de interferencias y cierre para habilitar el modelado 3D. Ex «MEP 2D» — se renombró a Ingenierías porque la estructura ahora vive dentro de este proceso (la checklist arranca con 1-Estructuras).

Actualizado al proceso vigente · a validar

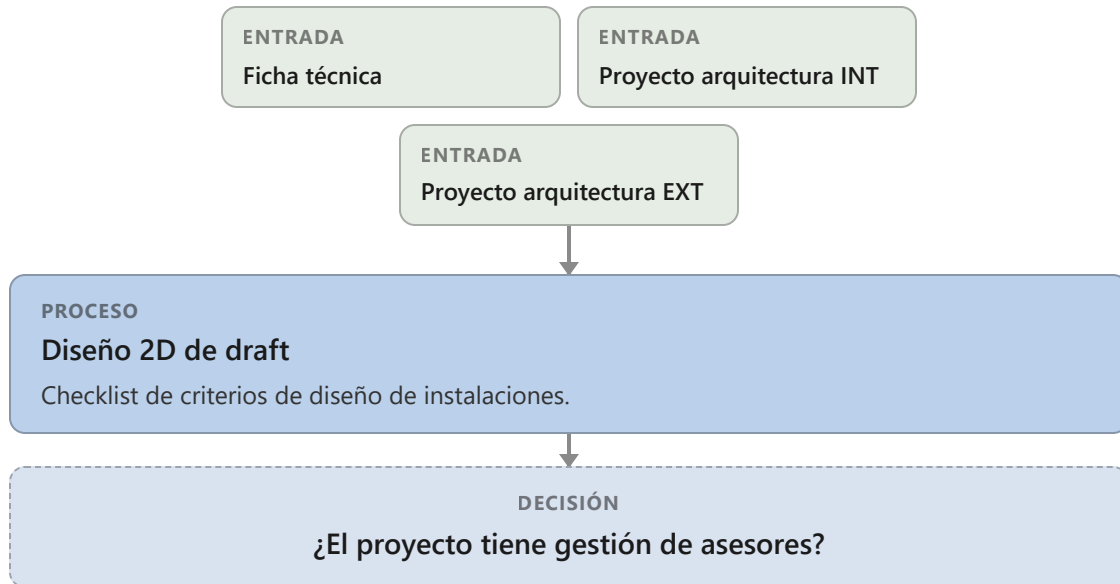

SÍ · CON GESTIÓN DE ASESORES

Croquis base para asesores

DRAFT

Draft / asesores

DWG EST x nivel

DWG SAN x nivel

DWG AFC x nivel

DWG CMA x nivel

DWG GAS x nivel

DWG ELE/ILU x nivel

DWG FPT x nivel

DWG BTE x nivel

DWG FMO x nivel

*Estructura (EST) y sanitarias (SAN) ahora forman parte del set —
separación de archivos por nivel y sistema.*

Revisión de draft de asesores

DECISIÓN

¿Ajuste necesario?

Sí → Reunión / consulta con el asesor → ¿respuesta para ajuste?
Si no la da: **bloqueo** (insistir hasta obtener respuesta, asentar en bitácora).

Copiar y pegar en draft

No → se lleva el draft del asesor al modelo.

NO · SIN GESTIÓN DE ASESORES

El cliente envía la info del proyecto MEP

Se avanza directo a separar los archivos por nivel y sistema.


→ va directo a Coordinación 2D

PROCESO · CONFLUYEN AMBOS CAMINOS

Coordinación 2D — draft

DECISIÓN

¿Hay interferencias?

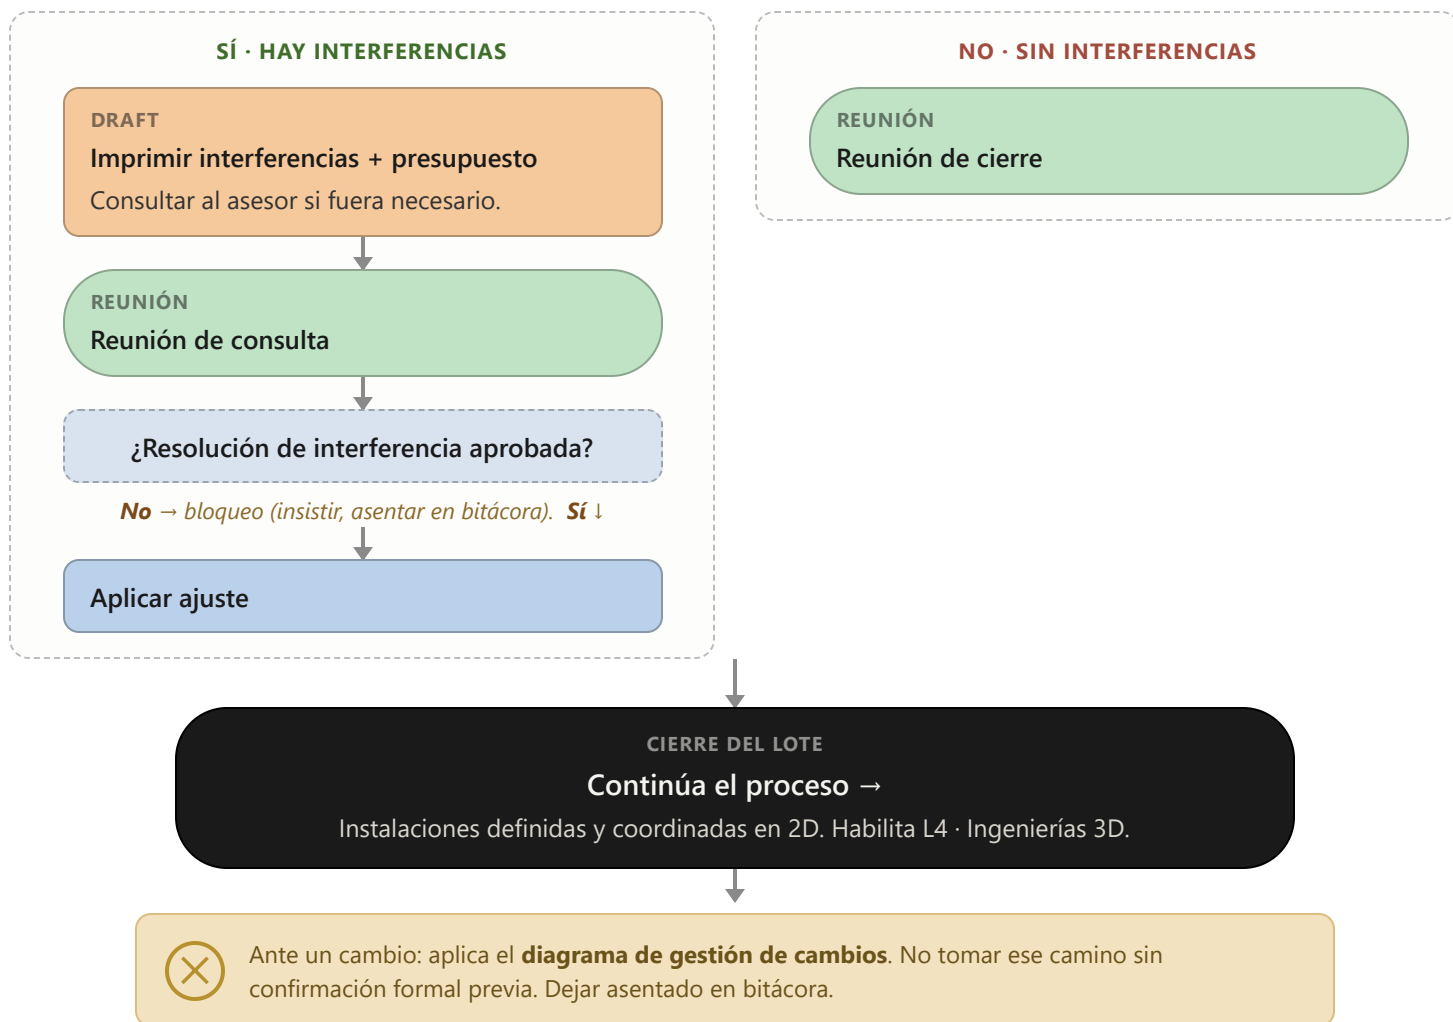


REFERENCIAS


- Entrada Proceso Draft / documento Reunión Decisión Bloqueo Cierre
- Gestión de cambios

Ingenierías 3D

Modelado troncal de cada sistema a partir de los draft 2D coordinados. Ex «MEP 3D». Incluye la rama condicional de modelado de estructura interna.

Actualizado al proceso vigente · a validar

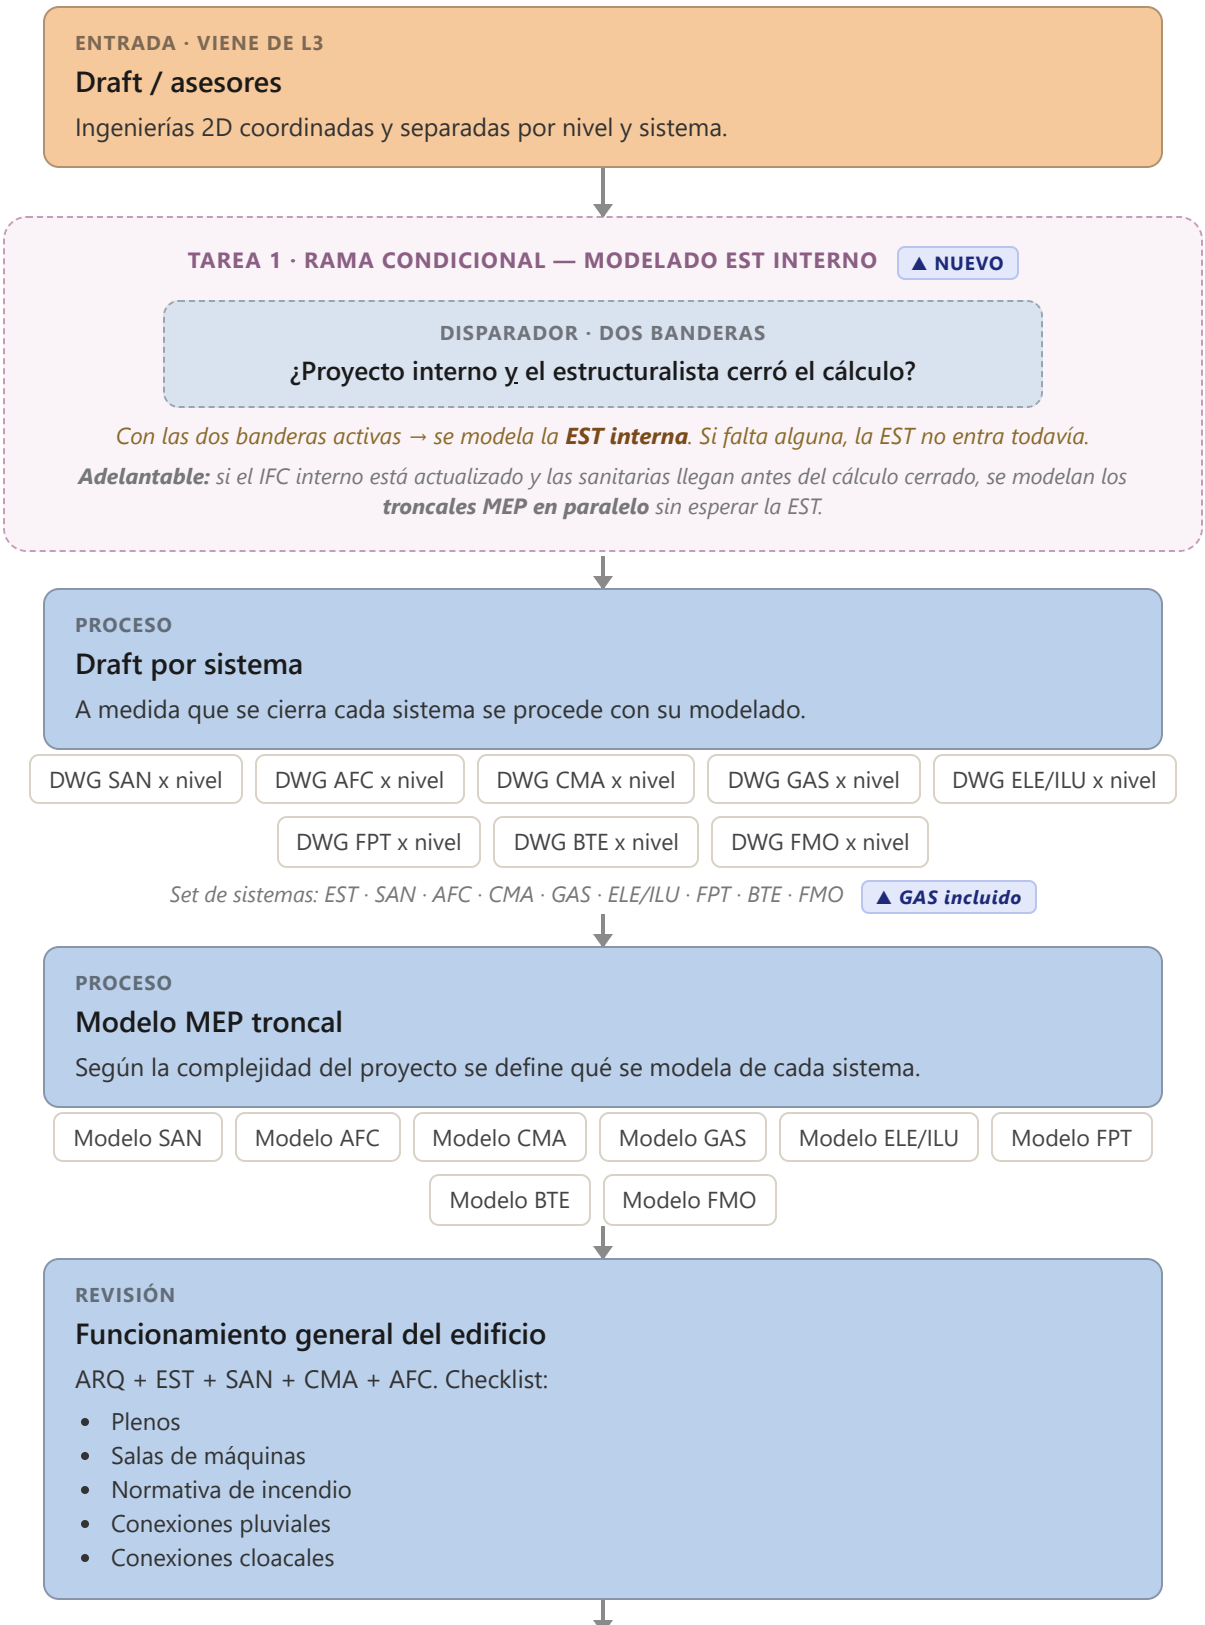

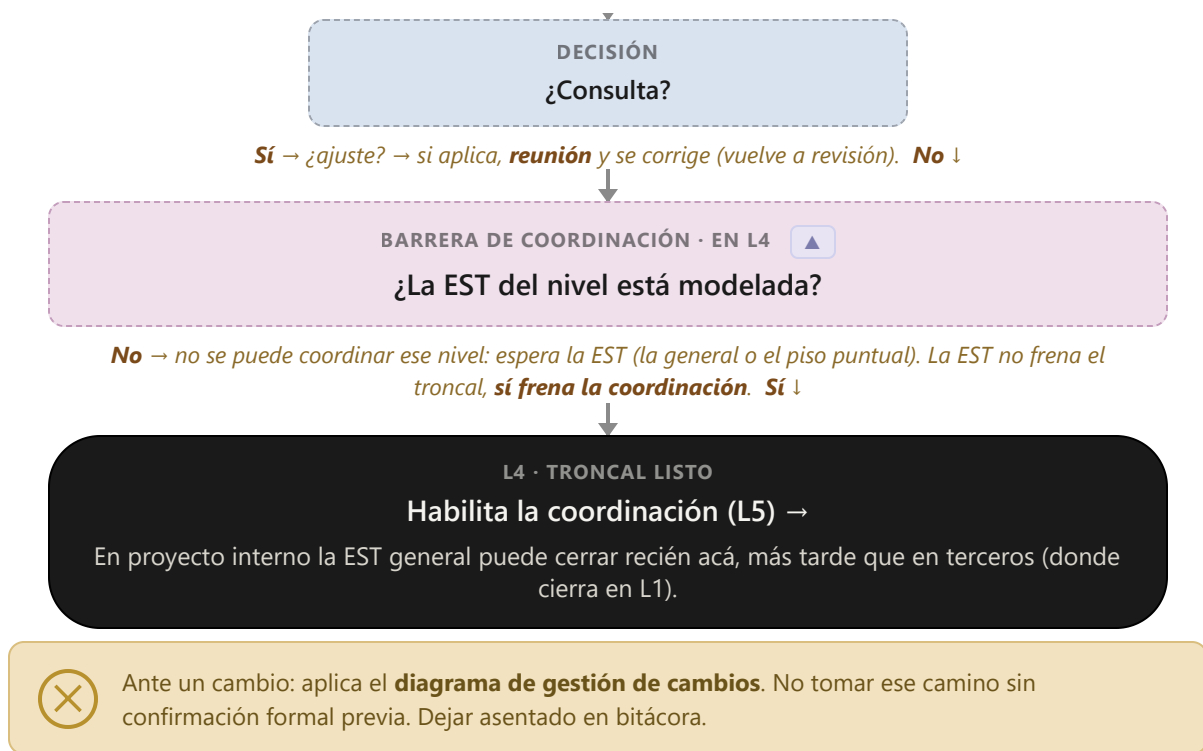


REFERENCIAS

-  Draft / documento  Proceso  Reunión  Decisión  Condicional / barrera  Cierre  ▲ actualizado
-  ? a confirmar

Coordinación + completitud

Coordinación de todos los sistemas por nivel, resolución de interferencias y modelado detallado (completitud). **Cierra por nivel:** el nivel cerrado se congela. Peso: 40%.

Actualizado al proceso vigente · a validar

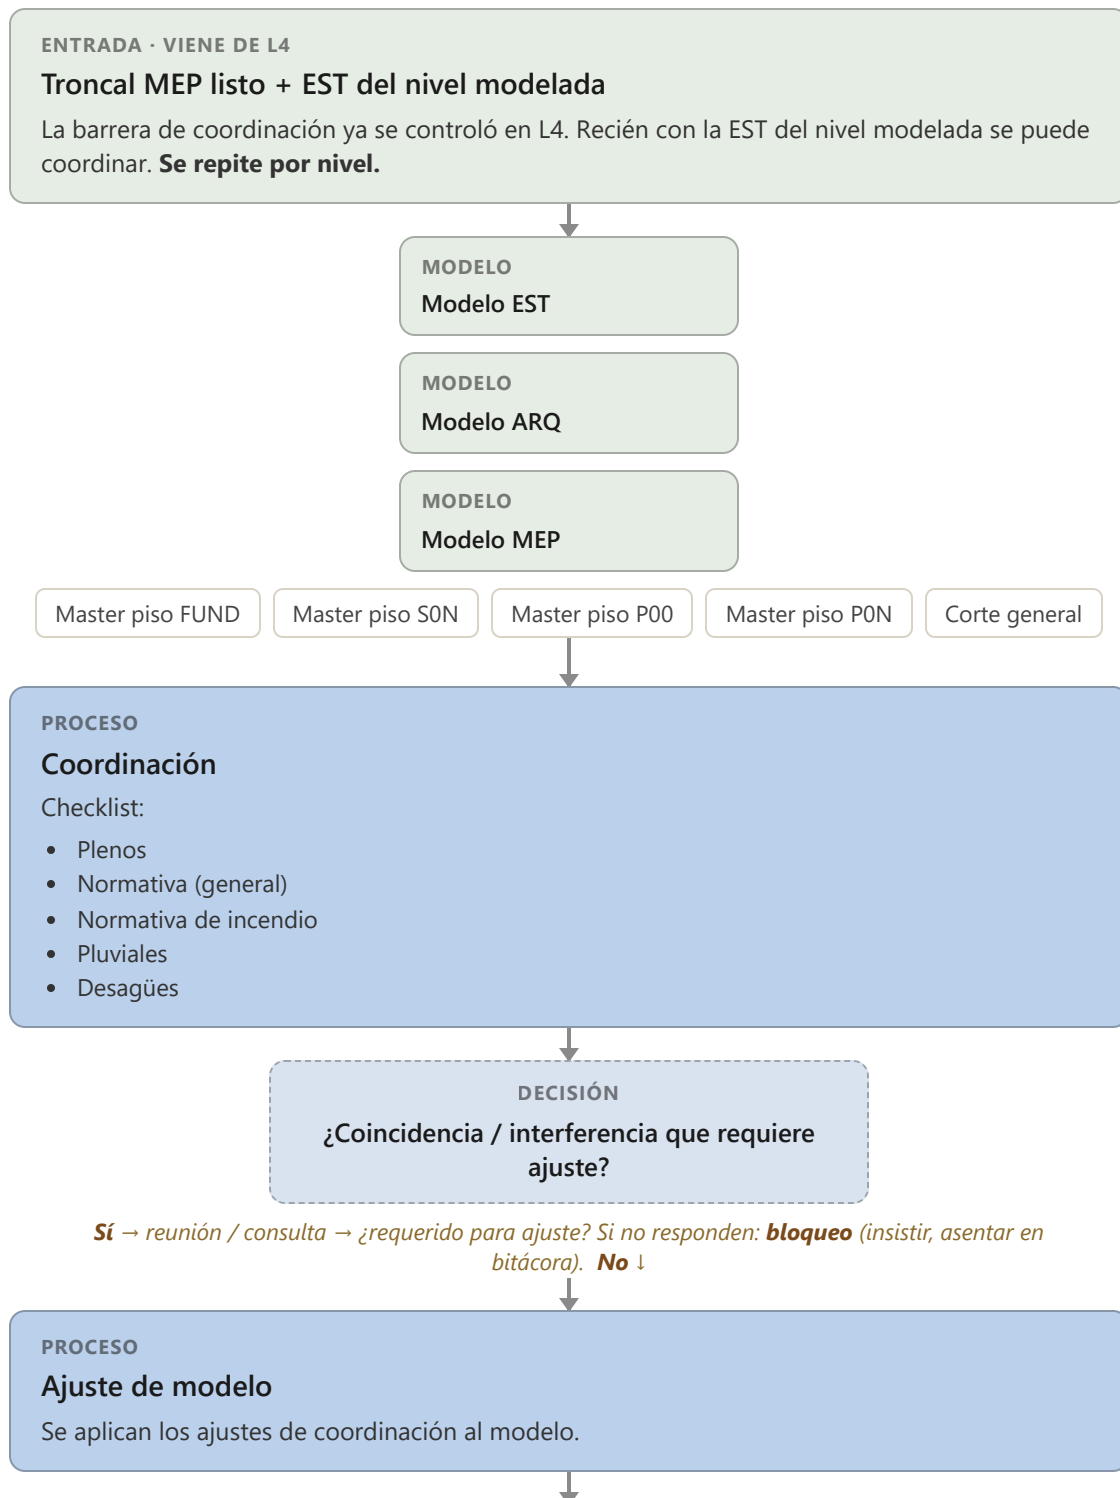

BISAGRA ▲ CLAVE

Documentar la coordinación — plano de interferencias

Coordinación del nivel LISTA + **documentada (plano de interferencias emitido)** es lo que **habilita el modelado detallado**. Sin este plano, no se pasa a completar.



COMPLETITUD ▲ VIVE EN L5

Modelado detallado

Checklist de modelado detallado por sistema. El detalle post-coordinación se hace acá (ya no en L4).

Modelo EST actualizado

Modelo ARQ actualizado

Modelo MEP actualizado



CIERRE POR NIVEL ▲ UNIDAD = NIVEL

Nivel coordinado y completo →

El nivel se congela. Un cambio posterior es extra-contractual. Habilita L6 · Documentación de ese nivel.



Ante un cambio: aplica el **diagrama de gestión de cambios**. No tomar ese camino sin confirmación formal previa. Dejar asentado en bitácora.


REFERENCIAS

■ Entrada / modelo ■ Proceso ■ Decisión ■ Barrera ■ Bloqueo ■ Cierre por nivel ■ ▲ actualizado

Documentación

Emisión de la documentación gráfica de cada nivel, por sistema. **Por nivel:** el nivel queda cerrado cuando toda su documentación está emitida. Peso: 10%.

Actualizado al proceso vigente · a validar

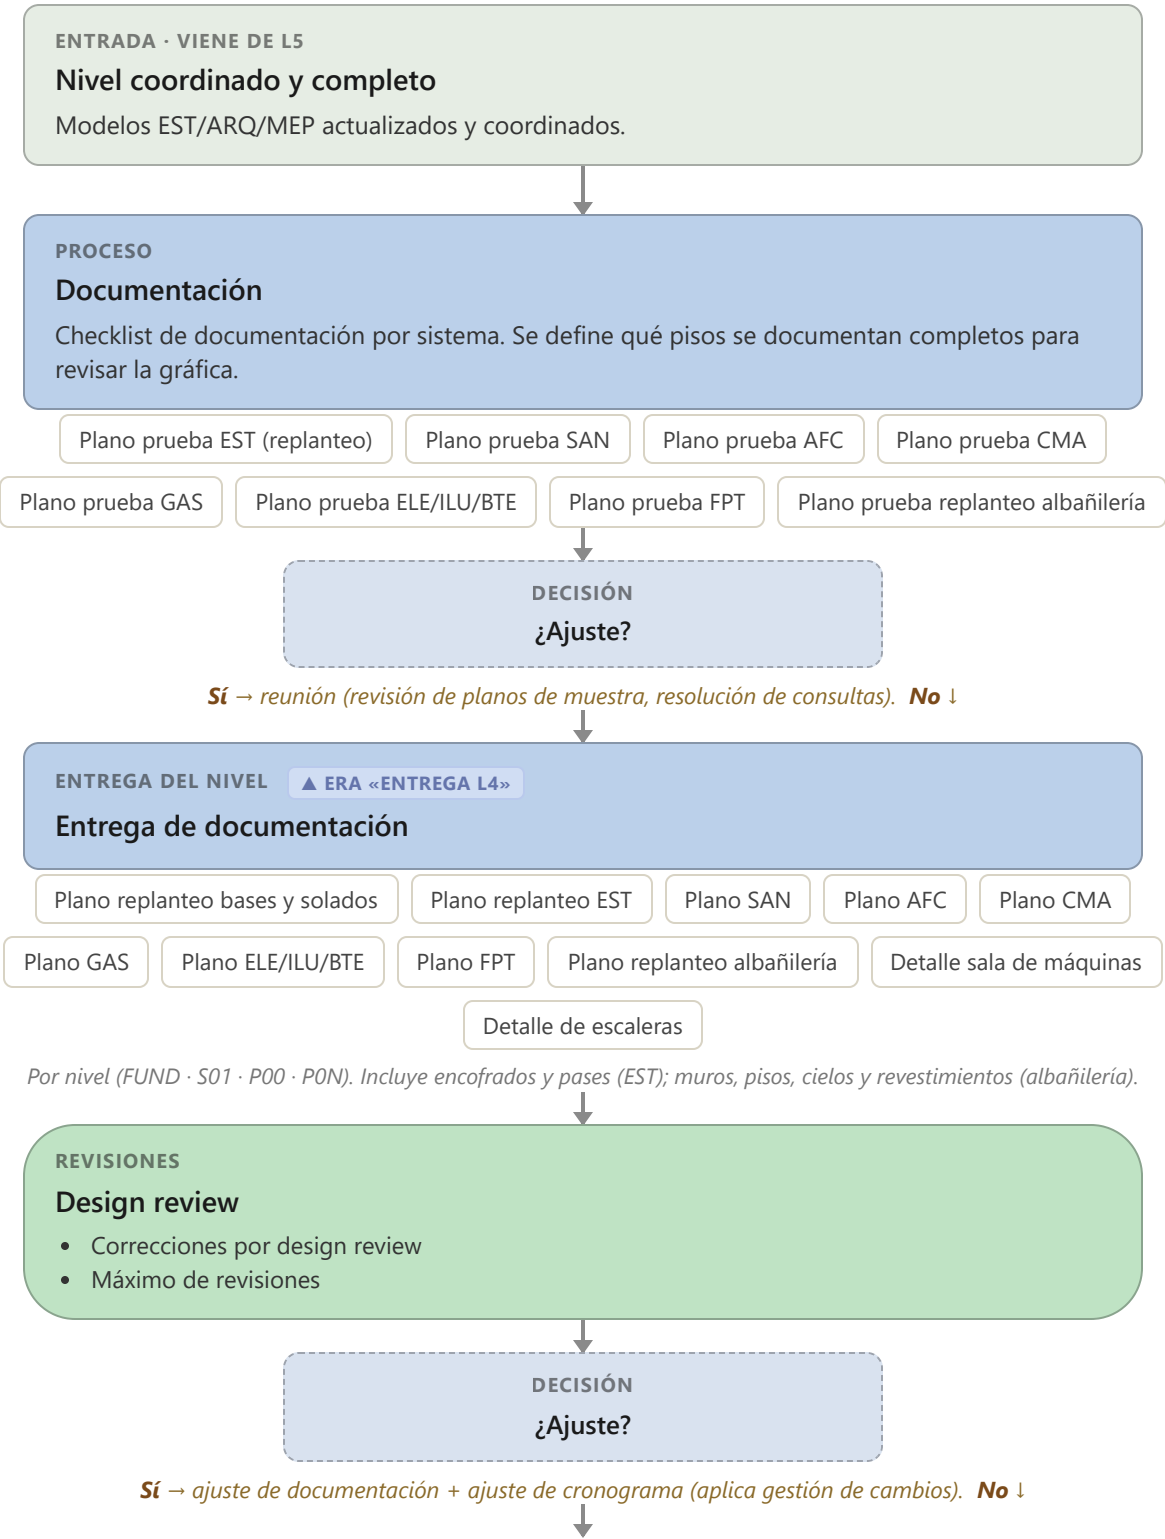

CIERRE DEL NIVEL ▲ SE CONGELA

Fin de etapa — nivel documentado

Cuando todas las celdas del nivel (ingenierías + ARQ) están documentadas, el nivel se congela.
Cambio posterior = extra-contractual.

SI HUBO AJUSTE ← RAMA DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Cuantificar complejidad del ajuste y origen del error → Medición de errores



Ante un cambio: aplica el **diagrama de gestión de cambios**. No tomar ese camino sin confirmación formal previa. Dejar asentado en bitácora.

REFERENCIAS


Entrada Proceso Reunión Decisión Cierre por nivel Medición de errores ▲ actualizado


Locales

Tipificación, modelado detallado y documentación de los locales del edificio (cocinas, baños, palieres, acceso, SUM, gimnasio).

Actualizado al proceso vigente · a validar

- ▲ Corre en paralelo
- ▲ Cuelga de ARQ detallada (L2)
- ▲ Realimenta la completitud (L5)

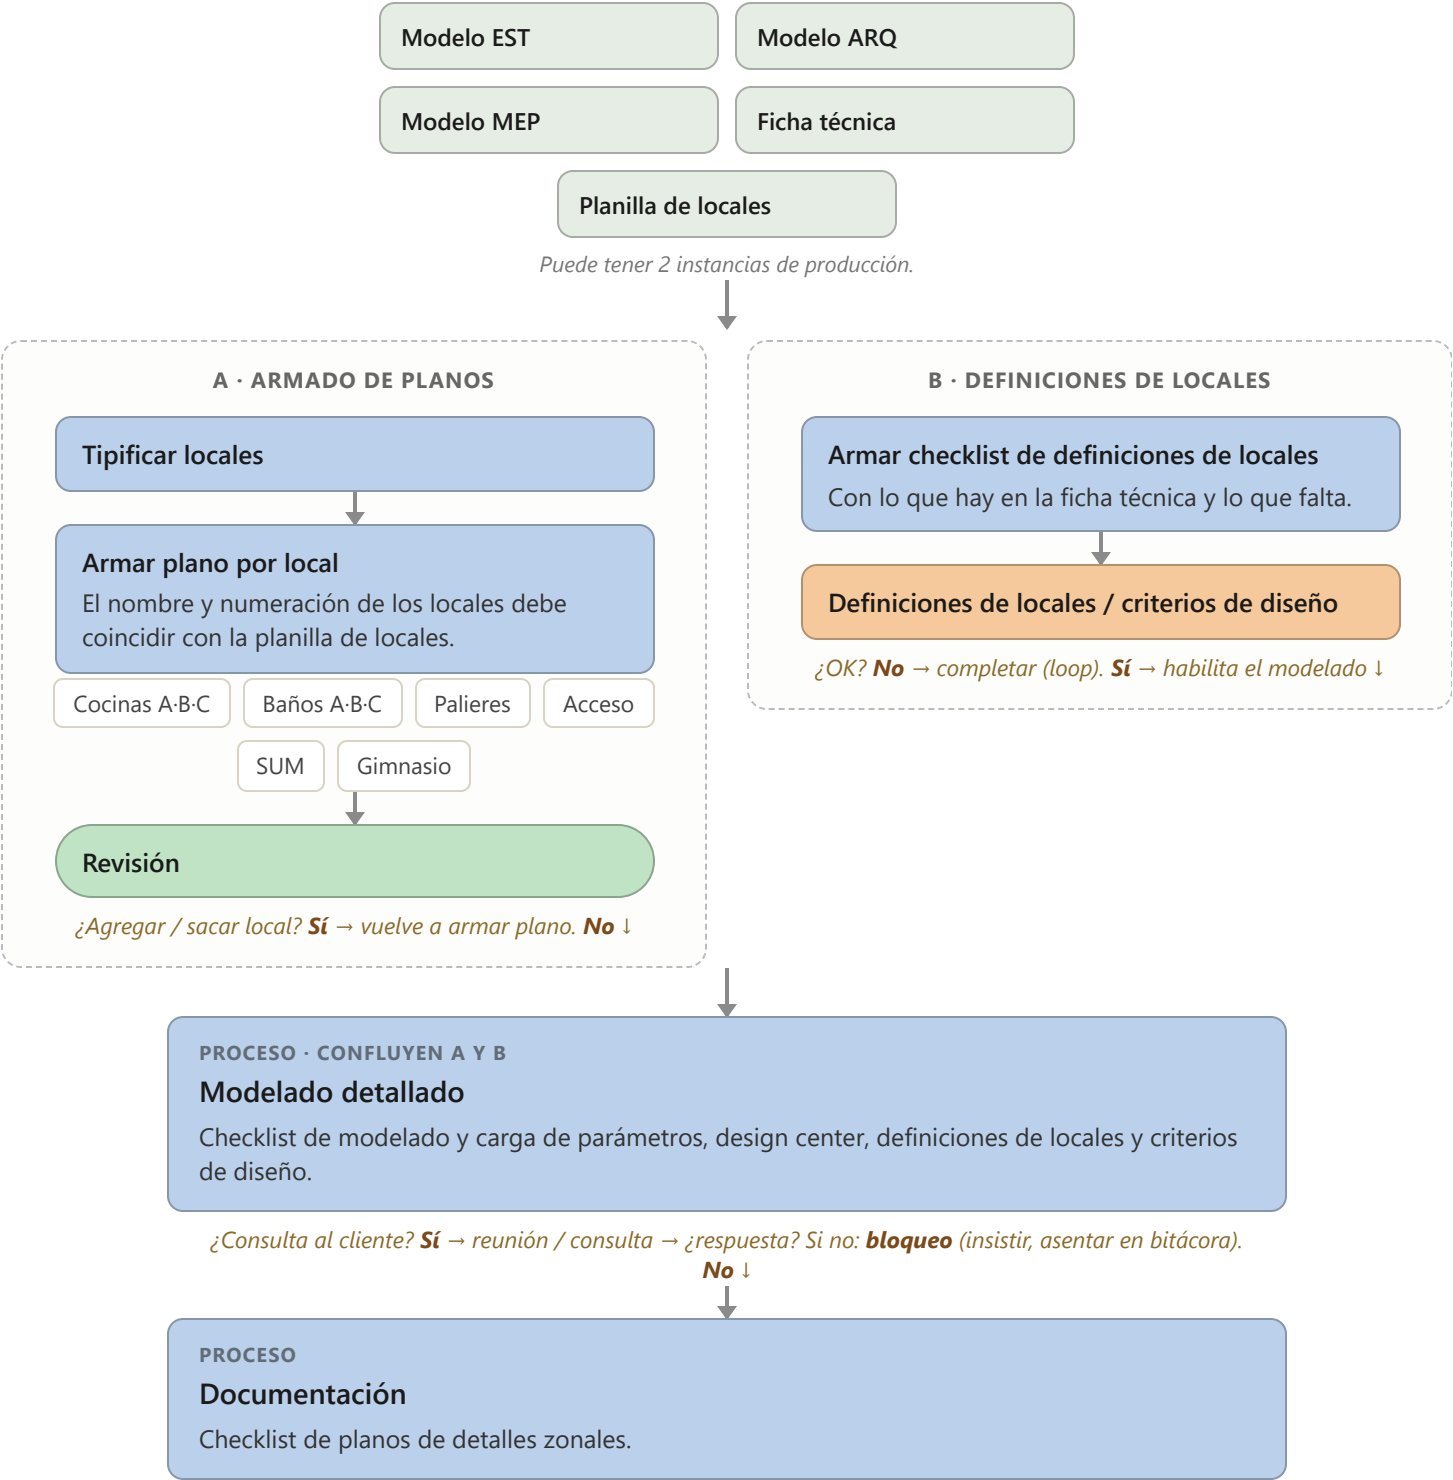

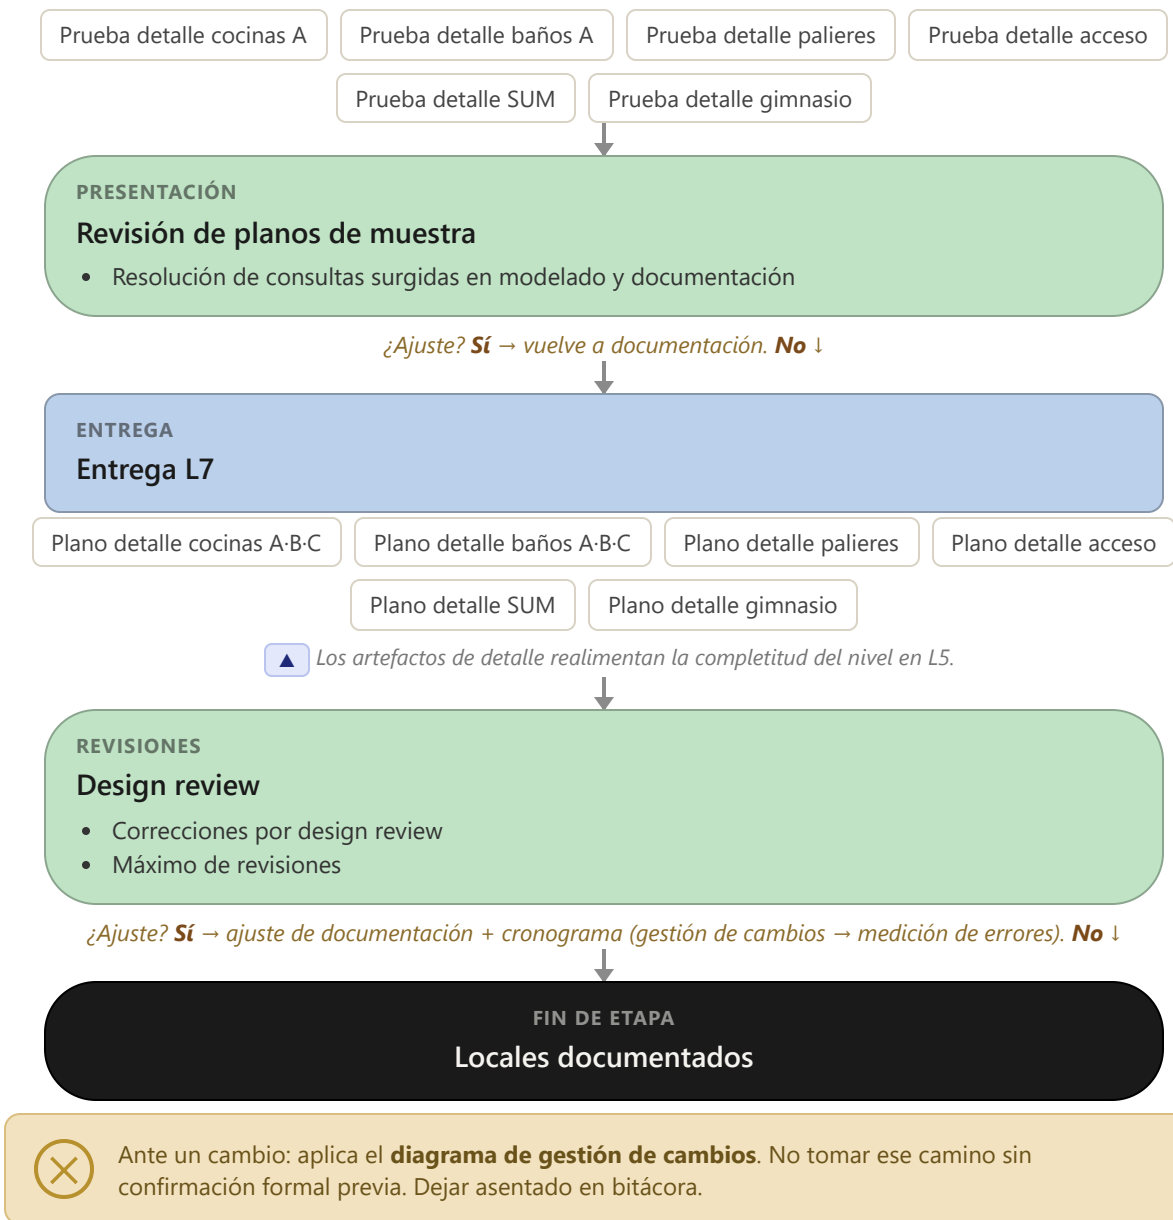

REFERENCIAS


Entrada Proceso Draft / documento Reunión Cierre ▲ actualizado


Detalles

Tipificación, parametrización y documentación de carpinterías: puertas, ventanas, barandas y herrerías, con sus planillas.

Actualizado al proceso vigente · a validar

- ▲ Corre en paralelo
- ▲ Cuelga de ARQ detallada (L2)
- ▲ Realimenta la completitud (L5)

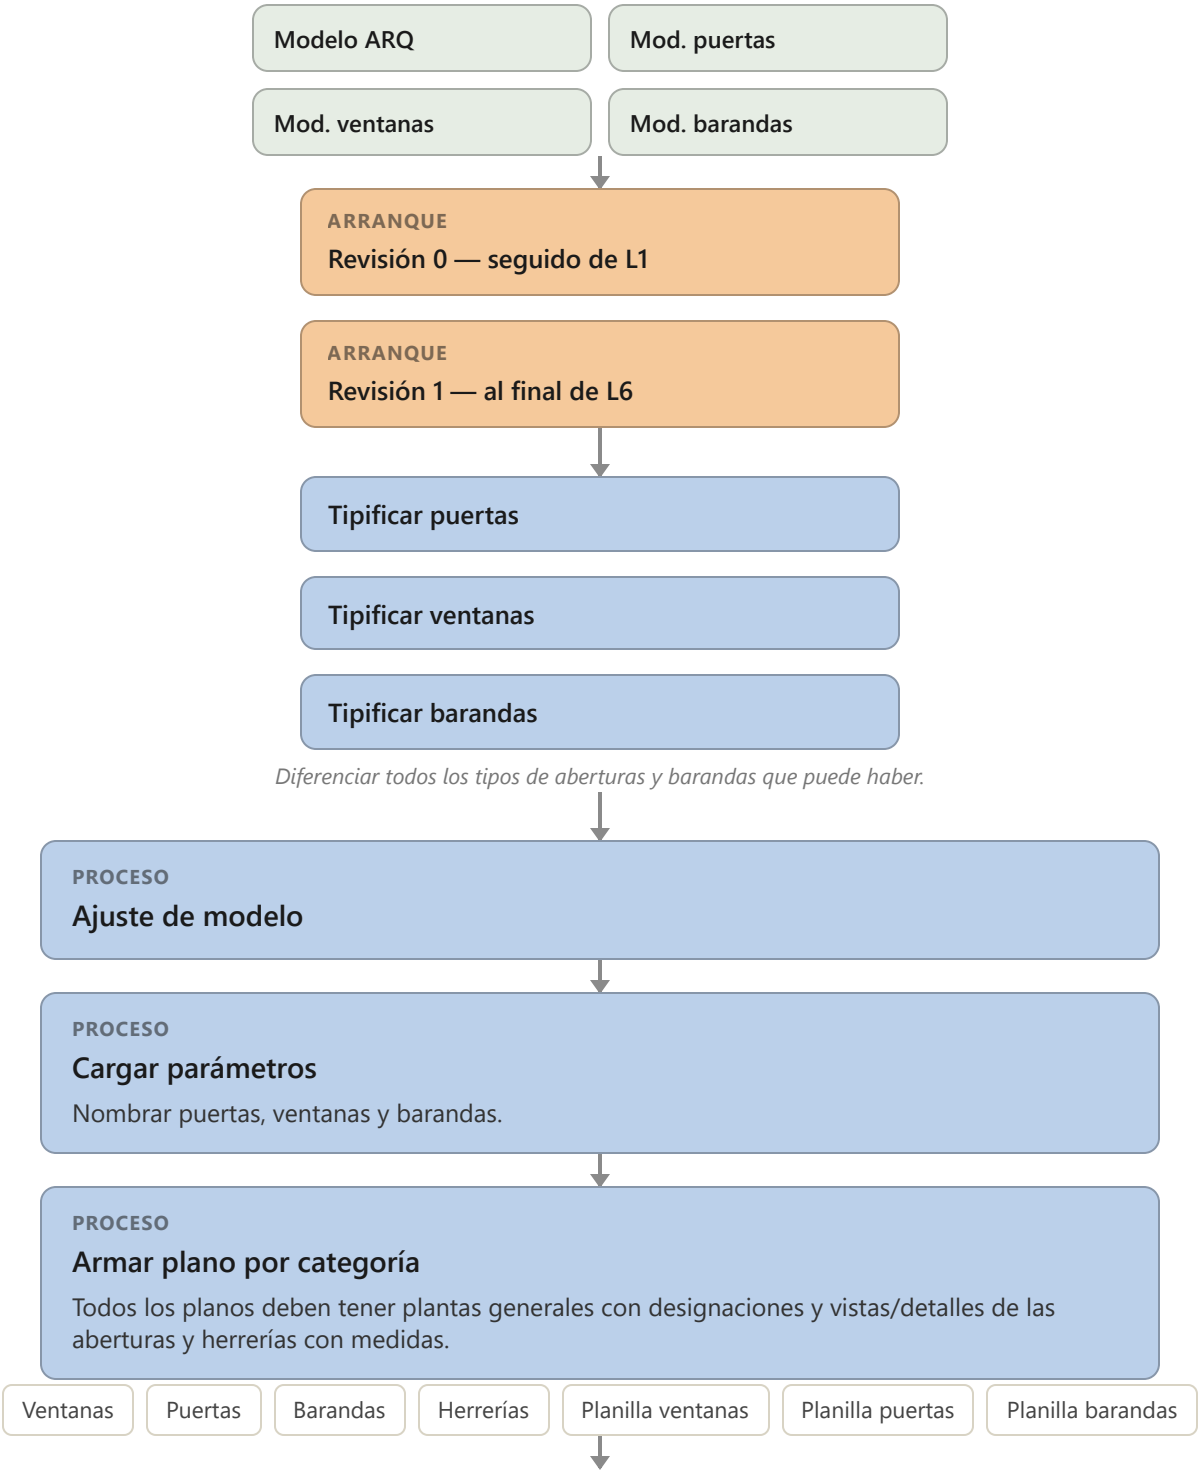

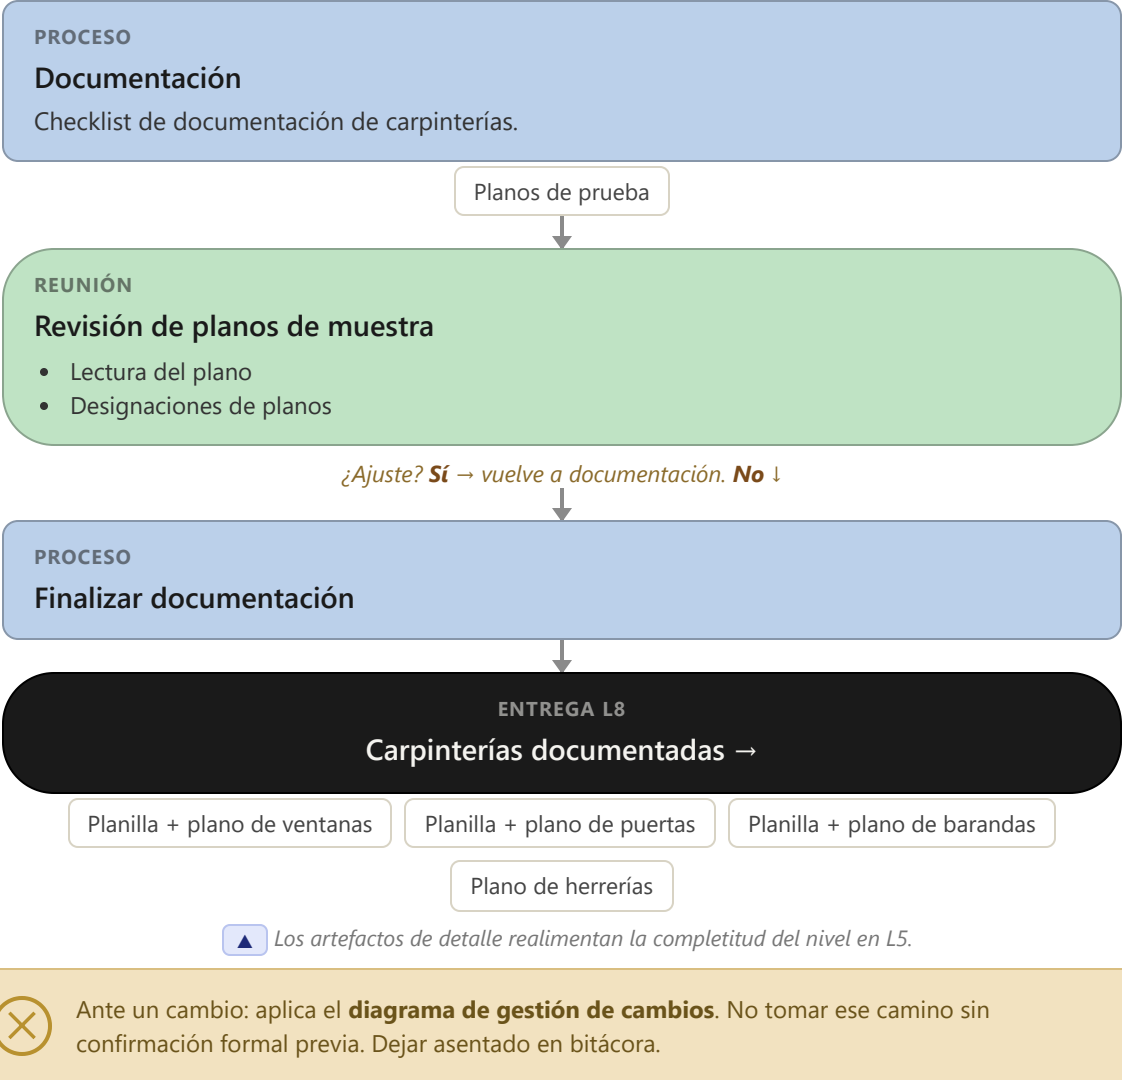

REFERENCIAS

Entrada Proceso Arranque / documento Reunión Entrega ▲ actualizado
